

# MINISTÉRIO DO ESPORTE



Centro de Iniciação ao Esporte  
Municípios Selecionados

## Programa do Centro de Iniciação ao Esporte – Informações Gerais

Evento CIE - 05/07/2018

Departamento de Infraestrutura de Esporte/  
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

# PROGRAMA CIE

## **Objetivo**

Ampliar oferta de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras.

## **Outras características**

- Composição com a Rede Nacional de Treinamento, garantindo capilaridade à infraestrutura.
- Equipamento multiuso para identificar talentos e formar atletas.
- Incentivo à prática esportiva em áreas de alta vulnerabilidade social.
- Estímulo ao desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento nacional.

# INVESTIMENTO NO ESPORTE



Figura: Morro da Mineira, Rio de Janeiro/RJ  
Fonte: [www.globoesporte.globo.com](http://www.globoesporte.globo.com)

- **COMBATE AO SEDENTARISMO:** 45,9% dos brasileiros são sedentários (DIEsporte 2015). Sedentarismo: doença do século, porta de entrada para vários males (colesterol, cardiovasculares, depressão, diabetes, etc).
- **SAÚDE:** Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada dólar investido no esporte, economiza-se 3,2 na saúde.

Importante facilitador do **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:** realização do desenvolvimento e da paz ao promover a tolerância e o respeito e empoderamento das mulheres e dos jovens, indivíduos e comunidades, bem como aos objetivos da saúde, educação e inclusão social (Agenda 2030)

# INICIAÇÃO ESPORTIVA

## **Política Nacional de Esportes (Resolução nº 05/2005):**

Incentivar o desenvolvimento de talentos esportivos em potencial e aprimorar o desempenho de atletas e paraatletas de rendimento, promovendo a democratização da manifestação esportiva.

## **Políticas Setoriais do Esporte (Resolução nº 10/2006):**

Ampliar o acesso ao esporte de alto rendimento e adequar a infraestrutura à formação da base do EAR.

## **Plano Decenal (2010) – III Conferência Nacional do Esporte:**


Prevê a implantação da Rede Nacional de Treinamento, na qual está inserido o CIE.

**Legado Olímpico (Portaria nº 14/2013):** maior projeto dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, assegurando o máximo legado para a sociedade brasileira.

# INICIAÇÃO ESPORTIVA

**Grande contingente de crianças/jovens sem acesso à iniciação da prática esportiva:** não há disponibilidade de escolas de iniciação desportiva nas diversas modalidades.

Plano nacional com o objetivo de universalizar a iniciação à prática esportiva, de modo a garantir a todas as crianças e jovens, que desejem se desenvolver no esporte, a oportunidade de frequentar escolinhas de modalidades, com condições mínimas de transporte e alimentação e equipamento adequado ao nível da inicialização.



**Relatório TCU  
sobre Esporte  
de Alto  
Rendimento -  
2011**

# Algumas premissas do Programa

**Fornecer tipologias de projeto padronizado,** permitindo a escolha por parte do tomador:

Modelo I – Ginásio


Modelo II – Ginásio e quadra descoberta

Modelo III – Ginásio e estrutura de Atletismo.

**Atender regiões vulneráveis.**

**Ter aderência com outras ações/programas públicos.**

**Fomentar a Gestão da instalação.**

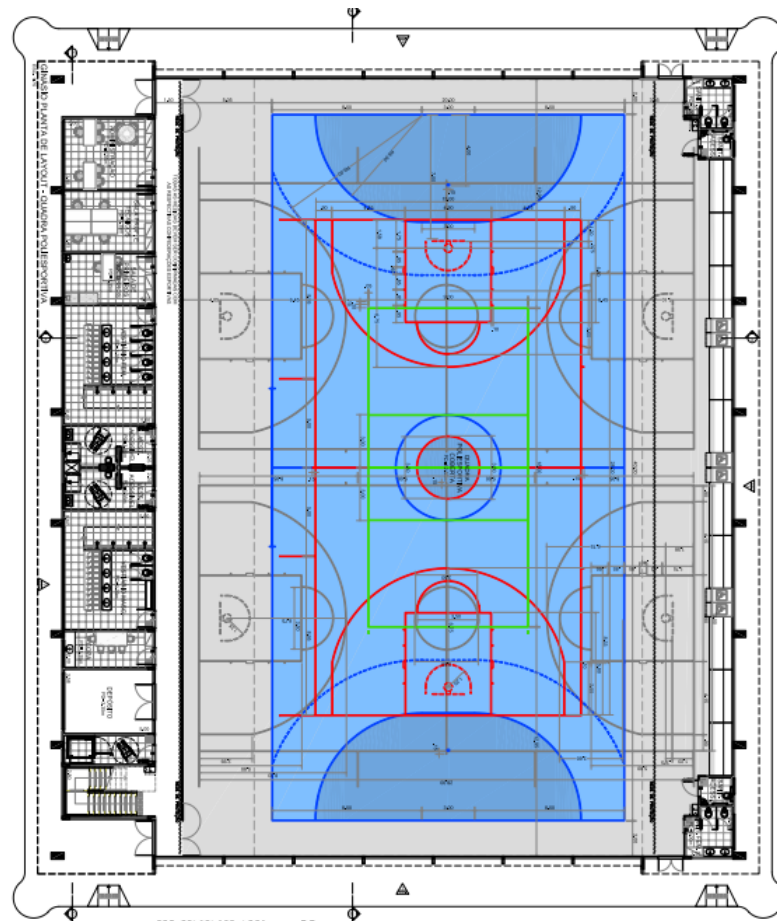




# Características dos projetos



**MODELO I**



# Características dos projetos

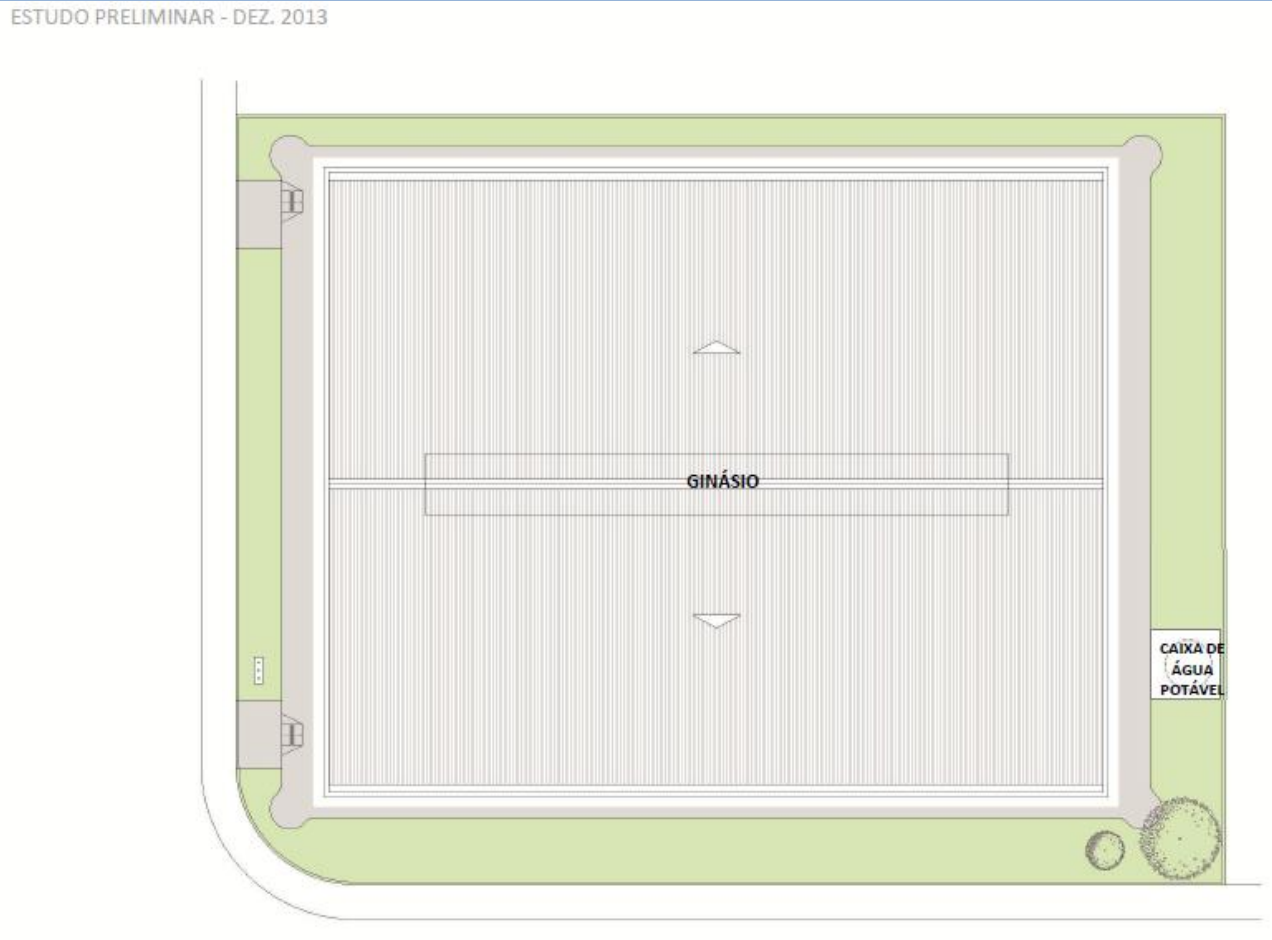

Obs.: Terreno  
mínimo de  
2.500m<sup>2</sup>

**MODELO I**





# Características dos projetos




**MODELO II**  
**Acrescenta quadra externa**



# Características dos projetos

ESTUDO PRELIMINAR - DEZ. 2013

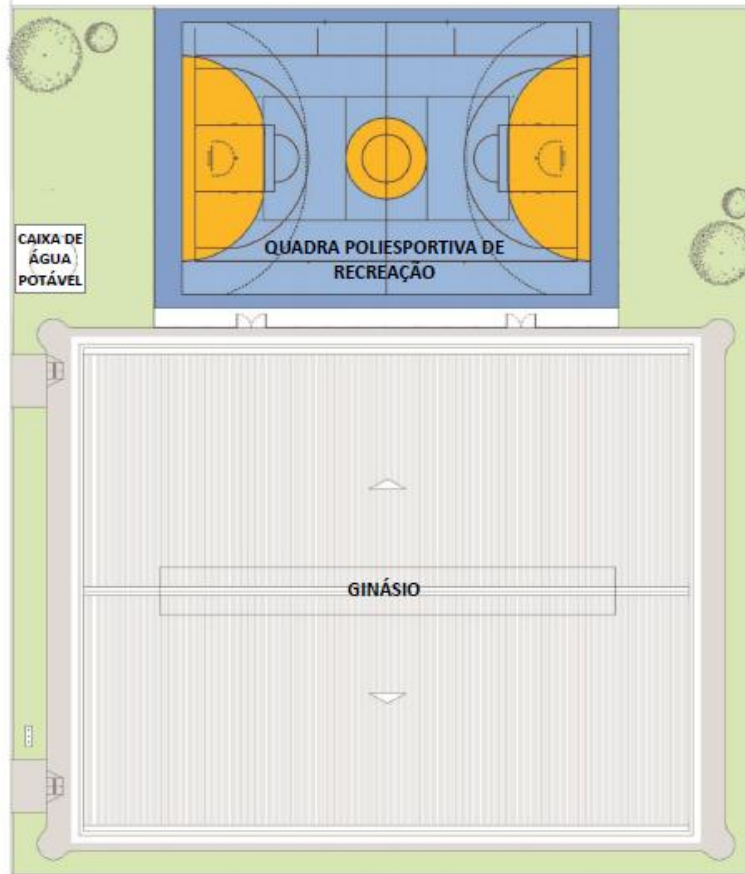

Obs.: Terreno mínimo de 3.500m<sup>2</sup>

**MODELO II**



# Características dos projetos




**MODELO III**

**Acrescenta Estrutura de atletismo**



# Características dos projetos

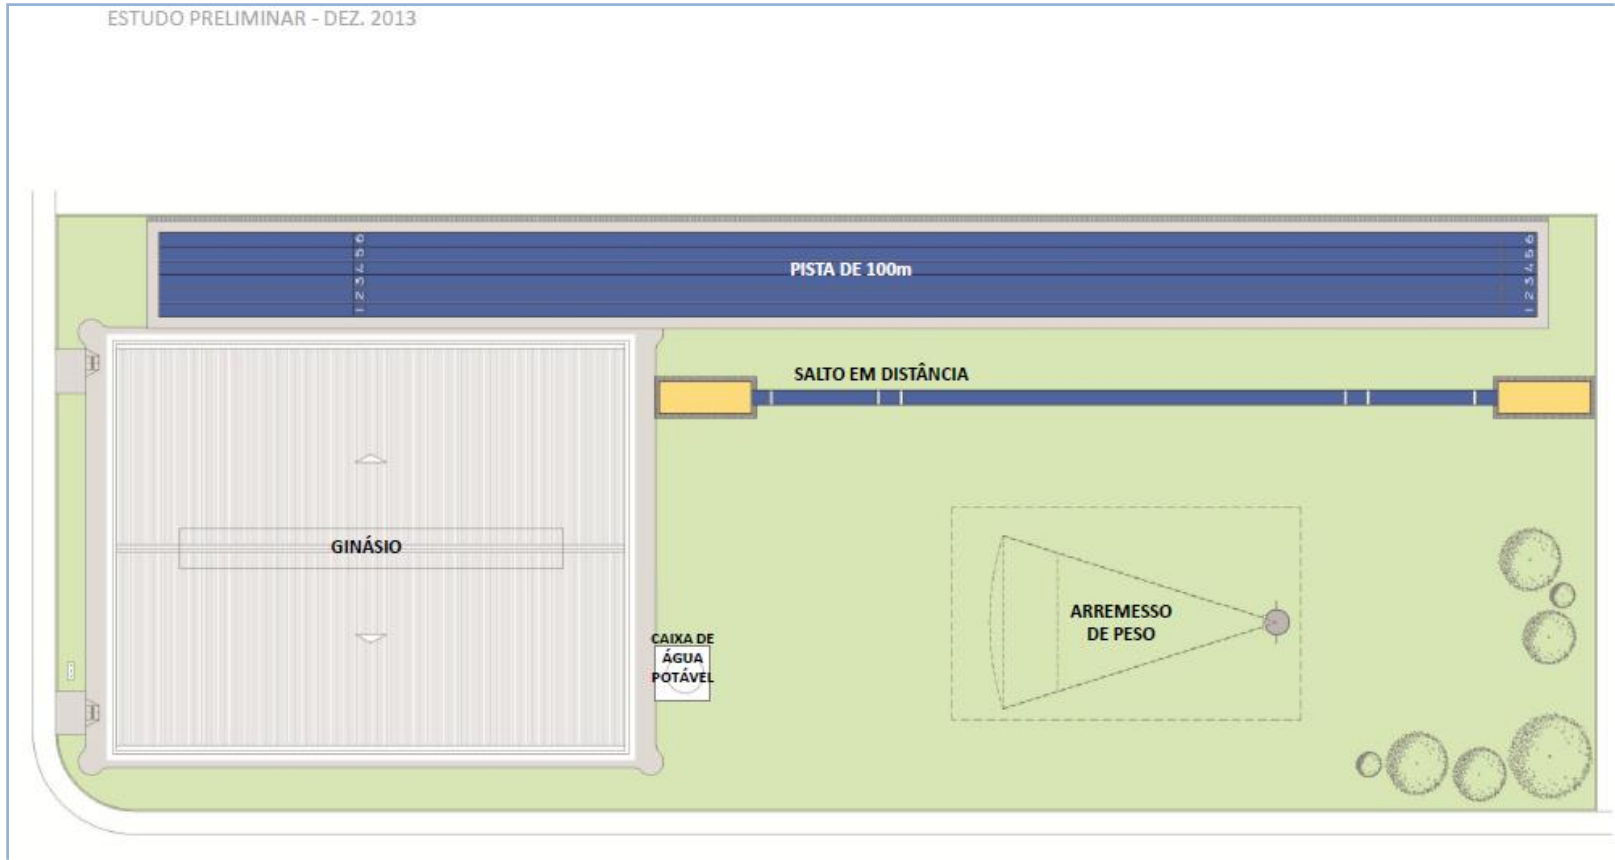

Obs.: Terreno mínimo  
de 7.000m<sup>2</sup>

**MODELO III**

## Características dos projetos


**Ginásio padrão:** quadra de 40 m x 20 m; altura de 12 m; piso sintético com camada de resina de poliuretano.

Arquibancada (177 lugares no simples; 122 no modelo reversível)


Espaços: academia; enfermaria; vestiários; copa; sala de professores / técnicos; depósito; salas de administração.

Requisitos de acessibilidade (rampas, plataforma elevatória, banheiros adaptados, portas mais largas, espaço para cadeiras nas arquibancadas).

Materiais de boa qualidade que permitem conforto térmico e acústico.

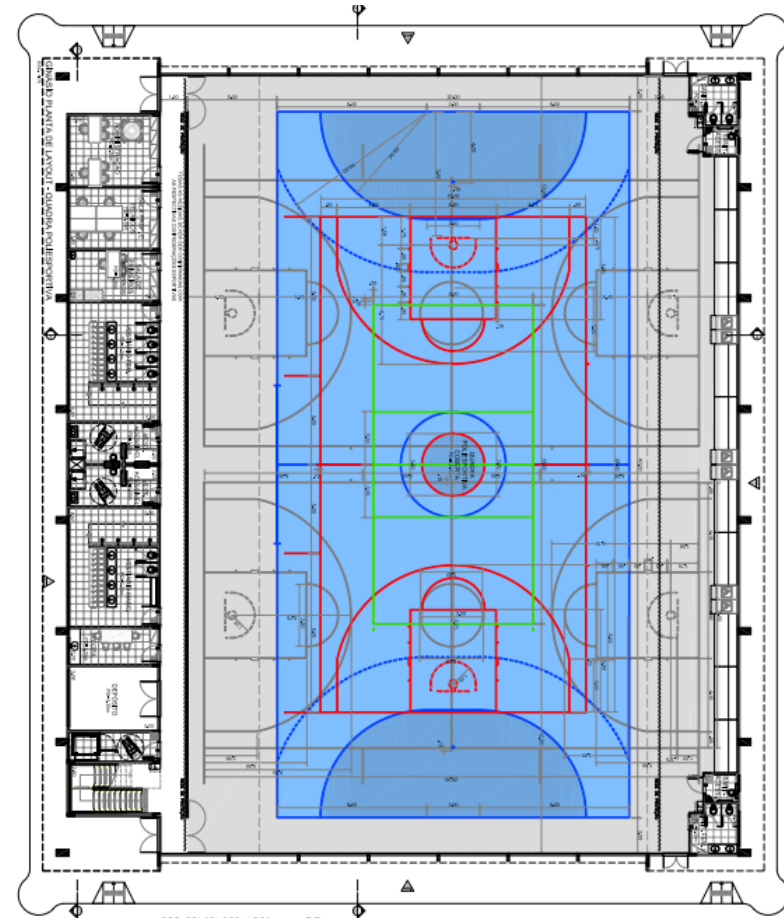


## Características dos projetos

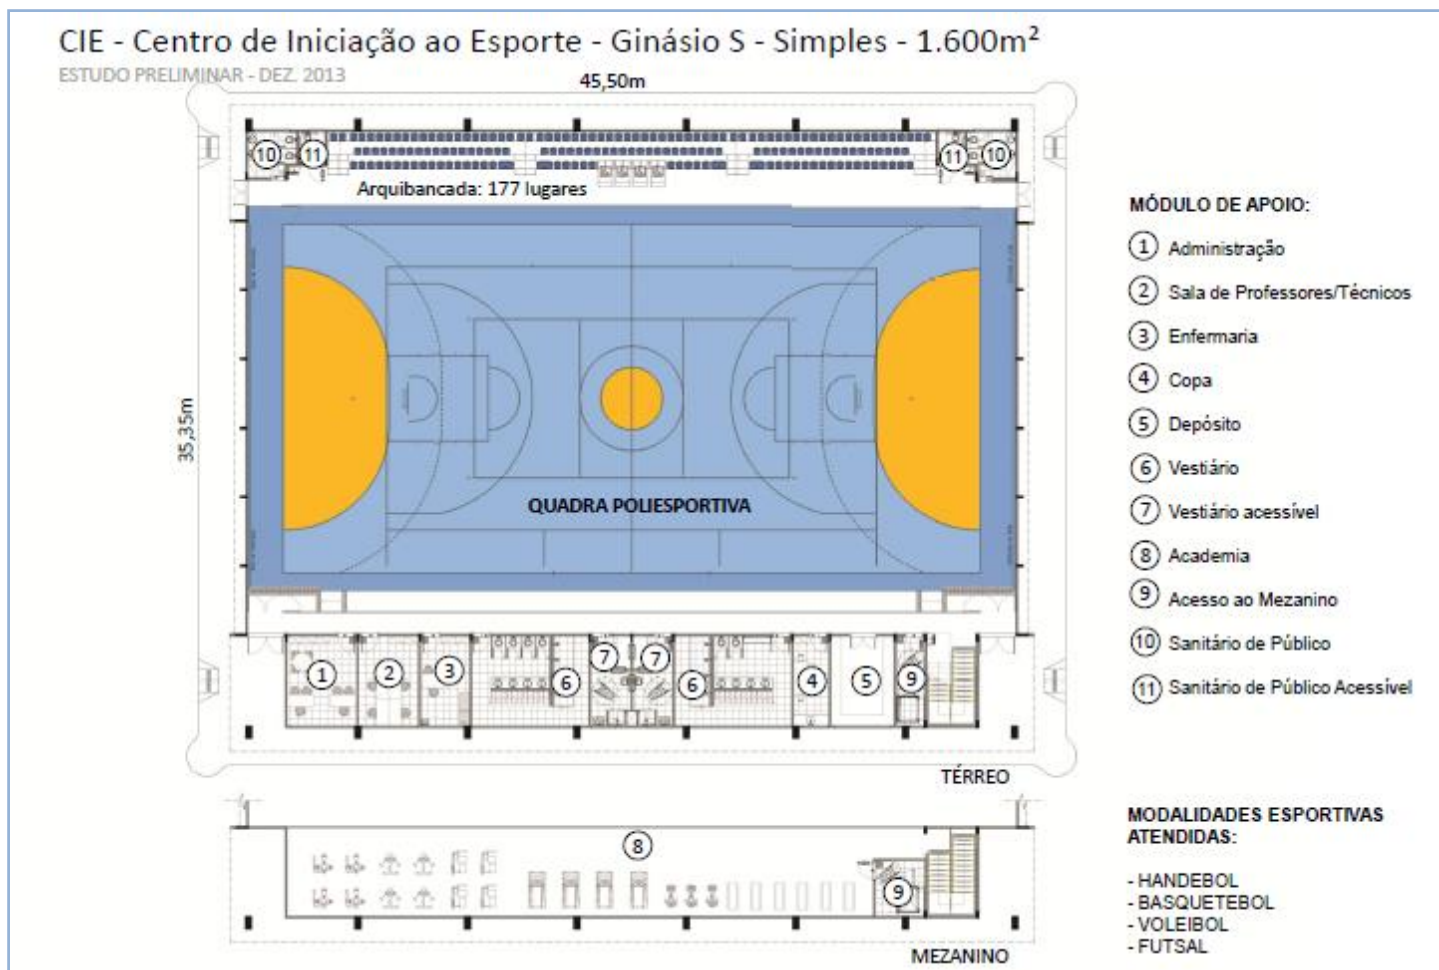

### GINÁSIO – QUADRA SIMPLES

## Características dos projetos

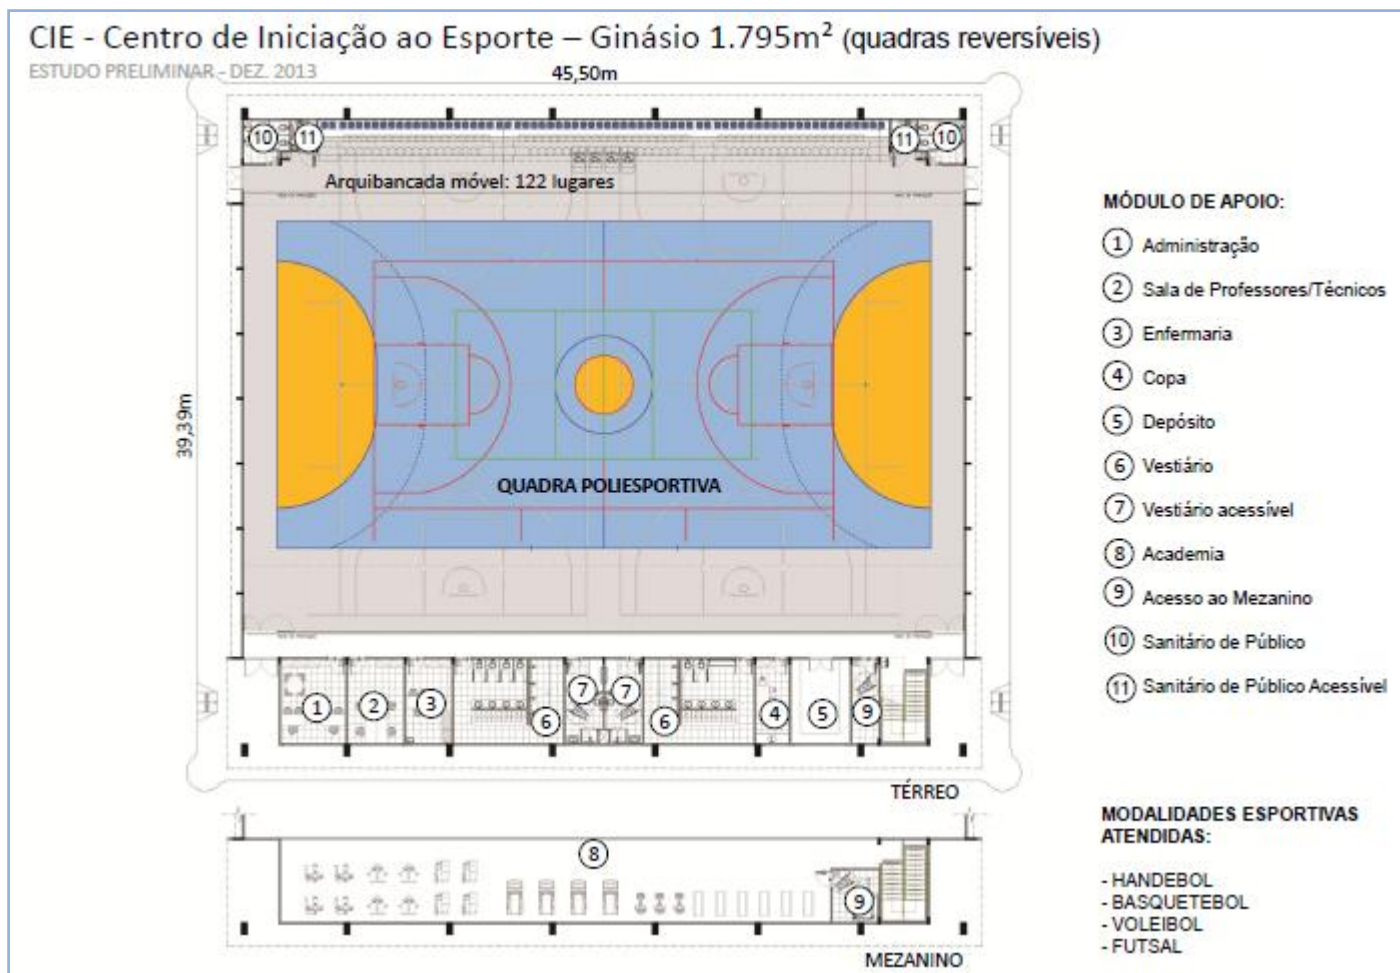

**GINÁSIO – QUADRAS REVERSÍVEIS**



# Características dos projetos

## 13 MODALIDADES OLÍMPICAS

- Atletismo
- Basquetebol
- Boxe
- Handebol
- Judô
- Lutas
- Tênis de Mesa
- Taekwondo
- Vôlei
- Esgrima
- Ginástica Rítmica
- Badminton
- Levantamento de Peso

## 6 MODALIDADES PARAOLÍMPICAS

- Esgrima de cadeira de rodas
- Judô
- Halterofilismo
- Tênis de Mesa
- Voleibol Sentado
- Goalball

**1 MODALIDADE NÃO-OLÍMPICA:** Futsal

**Pode ser um Centro de Especializado de alguma modalidade!!**



# Histórico - Etapa Inscrição

## Legislação


**Portaria nº 14** de 1º de fevereiro de 2013

## Data

Abril/2013

## Municípios Elegíveis

Regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Curitiba e Porto Alegre, Região Integrada do Entorno do Distrito Federal, cidades com população acima de 70 mil habitantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e acima de 100 mil habitantes no Sul e Sudeste. Lista completa foi divulgada no site do Ministério do Esporte.

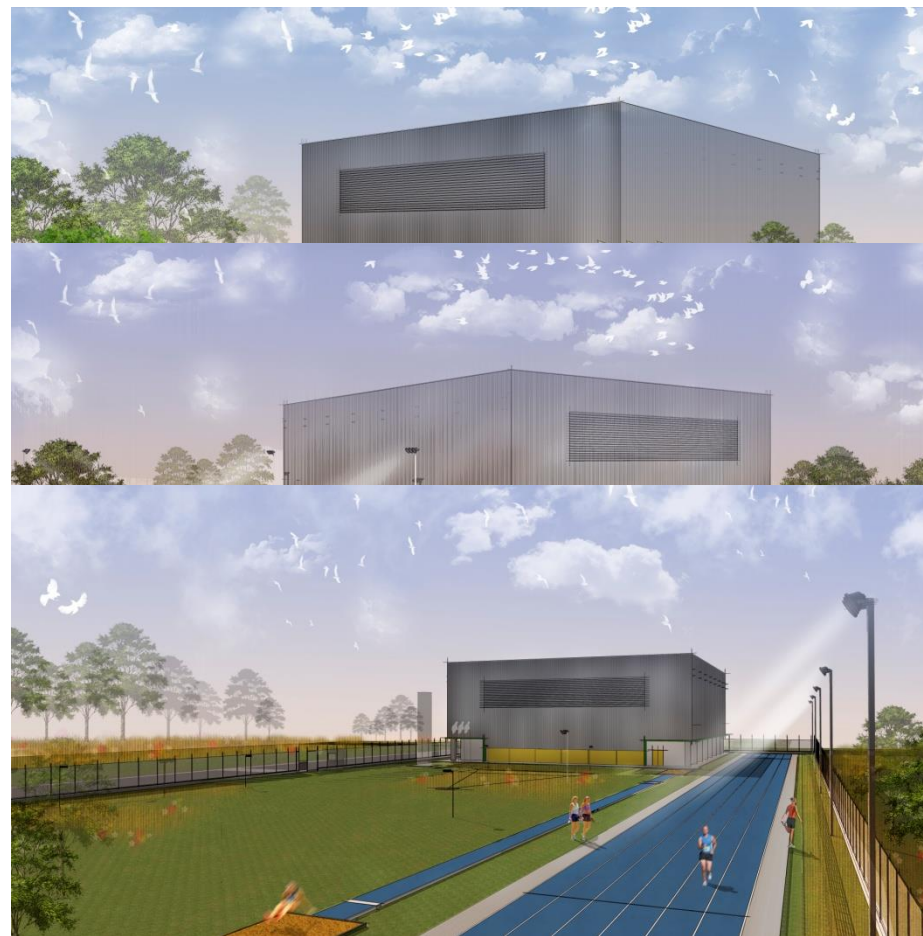

# Histórico - Etapa Inscrição

**Limite de propostas/  
município**

<b>Porte do Município (* habitantes)</b>	<b>Limite de Propostas</b>
Até 300 mil	1
De 300 mil a 500 mil	2
De 500 mil a 800 mil	3
De 800 mil a 2 milhões	4
Mais de 2 milhões	5

# Histórico - Etapa Inscrição

## CRITÉRIOS DE PRIORIDADE

- Regiões de alta vulnerabilidade social;
- Complementação de obras do programa Minha Casa Minha Vida;
- Situação fundiária que permita rápido início de obra;
- Porte populacional e/ou localização.

### Requisitos para a seleção

I - disponibilidade de terreno em localização, condições de acesso e características geotécnicas e topográficas adequadas para a implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte do PAC 2, conforme o Manual de Instruções;

II - compromisso do proponente com a gestão, o funcionamento e a manutenção do equipamento e com a continuidade das atividades relacionadas ao desenvolvimento das modalidades esportivas do esporte de alto rendimento;

III - possuir órgão específico responsável pelo desenvolvimento do Esporte (secretaria, diretoria, autarquia ou equivalente).

# Histórico - Etapa Inscrição

## Para formalizar a inscrição

- Disponibilizada senha para os municípios; e
- Inserção dos dados e documentos no site do CIE.

## Dados solicitados na inscrição

- ✓ Dados do município;
- ✓ Dados gerais do terreno;
- ✓ Caracterização da área atendida: nº de bairros, situação fundiária, população; estimativa da população, renda média estimada das famílias beneficiadas, equipamentos sociais existentes, obras de urbanização;
- ✓ Estrutura institucional para o esporte, programas esportivos em desenvolvimento, vocação esportiva, parcerias com entidades desportivas;
- ✓ Compromisso de gestão e manutenção do equipamento; dentre outros.

# Histórico - Etapa Inscrição

## Carta Consulta CIE - Administração



**ID Proposta 405**

### 1. Dados do Município / Distrito Federal

**Nome Munic./Distrito:** Prefeitura Municipal de Tucuruí

**UF:** Pará

**Prefeito:** sancler antonio wanderley ferreira

**CPF do Prefeito:** 11827912200

**Endereço Pref.:** travessa Raimundo Ribeiro de Souza nº 01 , Santa Isabel

**CEP:** 68456180

**Telefones:** (94)3787-9008

(94)9332-0255

(94)8174-9090


**E-mail:** sanclerferreira@yahoo.com.br

# Histórico - Etapa Seleção

## Pontuação das propostas

### Premissas:

- Disponibilidade orçamentária e financeira no Orçamento Geral da União (ou do Ministério do Esporte); e
- Convergência das propostas com os requisitos e critérios de priorização definidos na Portaria, e as orientações contidas no Manual de Instruções para Seleção dos Centros de Iniciação ao Esporte.



**Pontuação dos terrenos  
apresentados nas propostas**

## Histórico - Etapa Seleção

**Publicação da Legislação pertinente:**

**Portaria 298/2013 que contém os seguintes pontos principais:**

...

**Art. 8º Municípios devem elaborar o Plano de Gestão e Manutenção e é condicionante para a aprovação da prestação de contas final do termo de compromisso.**

**Evento realizado:**

**Realização do 1º Workshop Técnico em Dezembro/2013.**





**285** unidades selecionadas no país

**263** municípios contemplados

Todas as unidades da Federação  
com pelo menos uma unidade

Unidades por região:

- 8% Centro Oeste (22 unidades)
- 10% Norte (28 unidades)
- 13% Sul (38 unidades)
- 29% Nordeste (82 unidades)
- 40% Sudeste (115 unidades)

## Histórico - Etapa Seleção





## Histórico - Etapa Contratação

**Fornecimento de projetos padronizados aos proponentes:**


- ✓ Modelo I – Ginásio;
- ✓ Modelo II – Ginásio + Quadra Poliesportiva;
- ✓ Modelo III – Ginásio + Complexo de Atletismo.
- Ginásio: Simples ou Reversível.
- Velocidade de vento: 40 m/s, 45 m/s e 50 m/s.

- Adaptação do Projeto Básico às condições do terreno e legislação local;
- Disponibilizado R\$ 15 mil para essa adaptação

# Histórico - Etapa Contratação

## Documentação para contratação:

- ✓ Apresentar Termo de Referência para contratação da adaptação do Projeto (ME elaborou modelo de TR pré-aprovado para interessados)



**269** Termos de Compromissos assinados sem cláusula suspensiva

TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÃO E DO PROJETO IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

|

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÃO E DO PROJETO IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE


Obs.: Este Termo de Referência objetiva auxiliar os municípios na contratação de serviço de sondagem, elaboração do projeto de fundação e do projeto implantação, por isto, sugere-se que seja excluída a palavra "Modelo de" dos dizeres acima, deixando no título: "TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO A

## Histórico - Etapa Contratação

### Instituir a Unidade Gestora Local:

Composta, no mínimo, pelos seguintes membros:

- ✓ 01 engenheiro ou 01 arquiteto, responsável pelo acompanhamento do projeto e da obra;
- ✓ 01 membro do Órgão Municipal responsável de Esporte;
- ✓ 01 membro da Comissão de Licitação;
- ✓ Gestor/fiscal do Contrato/Termo de Compromisso do CIE, como interlocutor do ME e a CAIXA.



# Histórico - Etapa Contratação

## Muitos municípios com UGL defasada!!

### Para alterar Unidade Gestora Local:

- ✓ Solicitar a lista dos cadastrados para o ME, caso não tenha;
- ✓ Enviar e-mail para [cie@esporte.gov.br](mailto:cie@esporte.gov.br) – indicar exclusões e inclusões;
- ✓ No caso de inclusões, enviar:
  - Nome;
  - CPF;
  - E-mail da pessoa;
  - Telefone (fixo e celular);
  - Cargo na prefeitura;
  - Função na UGL.



# Histórico - Etapa Contratação

- Aceitação prévia dos projetos na CAIXA:
- ✓ Formação de Grupo de Trabalho conjunto com a CAIXA;
- ✓ Análise da compatibilidade dos documentos do projeto: peças gráficas, memorial descritivo, orçamentos e demais peças técnicas;
- ✓ Aprovação prévia das quantidades dos itens fixos;
- ✓ Itens variáveis em função do terreno e legislação, precisam de verificação da CAIXA local;
- ✓ Participação em videostreaming com Gerências Regionais de Engenharia da CAIXA para esclarecimentos;
- ✓ Manual de orçamento.



# Histórico - Etapa Contratação

## CRONOGRAMA

**1ª Etapa** – Sondagem, Projeto de Fundação e Projeto de Implantação (Adaptação)

Entrega na CAIXA: 31/12/2015 (Portaria nº 253/2015 do ME)

Aceite da CAIXA: 30/09/2017 (Portaria nº 204/2018 do ME) – **prazo da Portaria 483/2016 foi ampliado em função da troca de gestores no início de 2017 (final).**

**2ª Etapa** - Construção do CIE

Aceite Licitação da Obra: até 30/12/2017 (Portaria nº 204/2018 do ME) – **prazo da Portaria 483/2016 foi ampliado em função da troca de gestores no início de 2017 (final).**

Início da obra: até 30/12/2017 (Portaria nº 348/2016 do MPDG – Lista I e II do AIO)

Fim da Obra: até 30/12/2018 (Portaria nº 348/2016 do MPDG)

**NOVOS AIOs – IMPORTANTE INICIAR A OBRA**



## Histórico - Situação Atual

### Situação atual:

**136** Termos de Compromisso ativos

**134** Municípios atualmente beneficiados

**Todas operações** com Autorização de Início de Obra (AIO)

Os CIEs fazem parte do orçamento inicial do PAC-2: **R\$ 967 milhões**


**Valor atual: R\$ 482,4 milhões**



# Histórico - Situação Atual

## Dados Orçamentários e Financeiros:

Valor Repasse (R\$)	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liberado Pelo Gestor (R\$)	Valor Repasse Desbloqueado (R\$)	Saldo em Conta (R\$)
482.325.940,67	299.352.416,43	264.986.037,12	116.545.735,79	148.440.301,33




**Saldo médio em conta: R\$ 1.090.000,00**



# Histórico - Situação Atual

## Dados Físicos:

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
Inauguradas	8
Em andamento	68
Paralisadas	16
AIOs novos	44



UF	Municípios beneficiados	Empreendimento
UF	RIO BRANCO - AC	Modelo III
MG	UBERABA - MG	Modelo II
PR	ARAPONGAS - PR	Modelo II
PR	MARINGA - PR	Modelo I
RJ	PETROPOLIS - RJ	Modelo I
SP	BARUERI - SP	Modelo I
SP	FRANCO DA ROCHA - SP	Modelo II
SP	SANTANA DE PARNAIBA - SP	Modelo II

# Histórico - Situação Atual



# Histórico - Situação Atual

**RIO BRANCO/AC**



**PETRÓPOLIS/RJ**



**BARUERI/SP**



**SANTANA DE PARNAÍBA/SP**



# Acompanhamento do ME

## Fontes de informação:

### a. Sistema de Monitoramento do ME

### b. Base CAIXA

✓ Periodicidade: semanal

### c. Planilha de Necessidade Financeira

✓ Periodicidade: semanal

CAIXA E-PRESIDÊNCIA DE GOVERNO - VIGOV  
ORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - COPAC

PAC2 - BRASIL - Analítico - OGU - Ministério do Esporte

UF	GIGOV	Tipo de tomador	Tomador	Municípios beneficiados
AC	GIGOV/RB	MUN	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	CRUZEIRO DO SUL - AC
AC	GIGOV/RB	MUN	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC	RIO BRANCO - AC
AL	GIGOV/ME	MUN	MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL	ARAPIRACA - AL
AL	GIGOV/ME	MUN	MUNICÍPIO DE MACEIO - AL	MACEIO - AL
AM	GIGOV/MN	MUN	MUNICÍPIO DE COARI - AM	COARI - AM
AP	GIGOV/MC	MUN	MUNICÍPIO DE MACAPA - AP	MACAPA - AP
AP	GIGOV/MC	MUN	MUNICÍPIO DE SANTANA - AP	SANTANA - AP

Resumo Analítico Pendências Desativados

# Acompanhamento do ME

1ª Etapa   Licitação   Contratação   **Vitorias**

Nº Contrato: 0425959-87   Nº Proposta: 544

Vitorias

Nº Vistoria	Data da Vistoria
6	23/06/2011
5	

**IMPORTÂNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO**

Sistema de Monitoramento

TC	ADOR	% AFERIDO
42595987	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA - SP	72,86

Planilha de Necessidade Financeira

Obs.: defasagem provocada pelo prazo de vistoria estabelecido pelo Manual do PAC.

# Acompanhamento do ME



## Ferramentas disponíveis

Explore os materiais disponibilizados no site do CIE

### CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

Início

Municípios selecionados

Carta-Consulta (Fase encerrada)

Etapas Anteriores

Modalidades previstas

Cronograma

Modelos de CIEs

Manuais

Legislação

Identidade Visual

Perguntas Frequentes

Contato

PAC



Caderno Técnico-Operacional  
Versão 3



Sistema de Monitoramento

- Orientações para o preenchimento  
do Sistema de Monitoramento



Apresentações dos Workshops  
Técnicos do CIE



Projetos do CIE



Relatórios de Evolução das  
Obras



Transparência Pública

Informações adicionais CAIXA




Manuais Técnicos




Autorização Início de Obra

# Ferramentas disponíveis

a. Caderno Técnico-Operacional – responsabilidade das partes



b. Apresentações dos eventos técnicos: programa, obra e gestão.





## Ferramentas disponíveis

### c. Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério do Esporte (Portaria 54/2014)

#### Manuais

- ▶ [Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério do Esporte inseridos no PAC](#) - arquivo PDF - 449 KB
- ▶ [Manual de Seleção](#) - arquivo PDF - 466KB
- ▶ [Manual de Instruções para Preenchimento da Proposta](#) - arquivo PDF - 730KB



### d. Manuais Técnicos importantes:

#### Manuais Técnicos

- ▶ [Manual de Obras do TCU](#) - arquivo PDF - 1 Mb
- ▶ [Manual de Orçamento](#) - arquivo PDF - 559 Kb
- ▶ [Modelo Plano de Gestão](#) - arquivo PDF - 180 Kb
- ▶ [Manual de Preenchimento Plano de Gestão](#) - arquivo PDF - 281 Kb



Manual de Obras do TCU



Plano de Gestão

## Ferramentas disponíveis

e. Publicação da Legislação pertinente no site do CIE



### Legislação


Última atualização em Terça, 12 Dezembro 2017 15:03  
Acessos: 14738

- ▶ Portaria nº 331, de 06 de Dezembro de 2017 - Arquivo PDF - 157 Kb
- ▶ Portaria nº 204, de 28 de Junho de 2017 - Arquivo PDF - 27Kb
- ▶ Portaria nº 88, de 30 de Março de 2017 - Arquivo PDF - 59Kb
- ▶ Portaria nº 483, de 13 de Dezembro de 2016 - Arquivo PDF - 52,3Kb
- ▶ Portaria nº 253, de 10 de Setembro de 2015 - Arquivo PDF - 54,3Kb
- ▶ Portaria nº 232, de 29 de Setembro de 2014 - Arquivo PDF - 53K
- ▶ Portaria nº 150, de 11 de Julho de 2014 - Arquivo PDF - 50K
- ▶ **Retificação** - Portaria nº 98, de 8 de Maio de 2014 - Arquivo PDF - 53K
- ▶ Portaria 55/2014 Retificação prazos CIE 2014 - Arquivo PDF - 53K
- ▶ Decreto nº 8.206, de 13 de Março de 2014 - Arquivo PDF - 240Kb
- ▶ **Retificação** - Portaria nº 298, de 10 de Novembro de 2013 - Arquivo PDF - 51Kb
- ▶ Portaria nº 298, de 10 de Novembro de 2013 - Arquivo PDF - 50,8Kb
- ▶ Portaria nº 14 de 1 de fevereiro de 2013 - Arquivo PDF - 51,7Kb

## Ferramentas disponíveis

### f. Sistema de Monitoramento:

- ✓ Periodicidade: mínimo mensal
- ✓ Importância/Responsabilidade: adequado acompanhamento e suporte do ME, quando necessário.
- ✓ Liberação de Recursos.
- ✓ Alimentação pelos componentes da UGL.

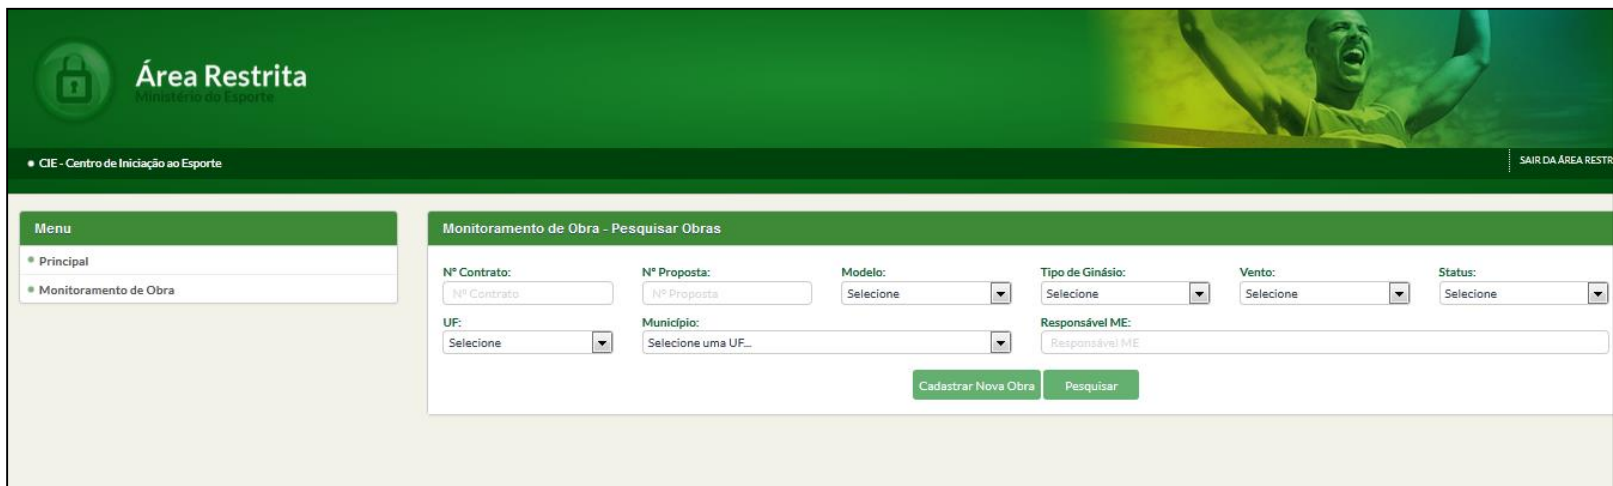

The screenshot shows a web application interface for project monitoring. The header is green with a lock icon and the text 'Área Restrita'. Below the header, there is a navigation menu on the left and a main content area on the right. The main content area is titled 'Monitoramento de Obra - Pesquisar Obras' and contains a search form with several fields and buttons.

Área Restrita

• CIE - Centro de Iniciação ao Esporte

SAIR DA ÁREA RESTRITA

Menu

- Principal
- Monitoramento de Obra

Monitoramento de Obra - Pesquisar Obras

Nº Contrato:

Nº Proposta:

Modelo:

Tipo de Ginásio:

Vento:

Status:

UF:

Município:

Responsável ME:

Cadastrar Nova Obra









Pesquisar


## Ferramentas disponíveis

### g. Transparência Pública

✓ Canal de comunicação com a sociedade; e

✓ Triangulação da informação.

	Caderno Operacional Versão 3	Técnico-		Sistema de Monitoramento - Orientações para o preenchimento do Sistema de Monitoramento
	Apresentações dos Workshops Técnicos do CIE			Projetos do CIE
	Perguntas e Respostas Workshop			Transparência Pública
	Manuais Técnicos			Autorização Início de Obra

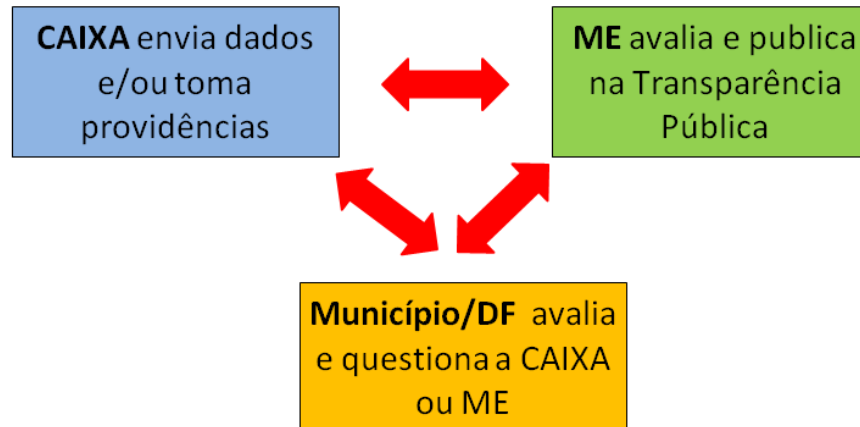

## Ferramentas disponíveis



The image displays a satellite map of South America with several location markers. A red-bordered window provides details for a project in Guanambi, Bahia (BA).

**Centro de Iniciação ao Esporte**  
**CIE**

**BA - GUANAMBI**  
Bairro: PARAISO

**Informações sobre a Proposta:**

- [Proposta 23](#) - Habilitada e Selecionada
- [Informações sobre a cidade](#)
- [Demais informações](#)

**Informações sobre o Contrato:**

nº Contrato: 426289-98	Situação do Contrato: SITUAÇÃO NORMAL
<a href="#">Modelo III</a>	Situação da Obra: NÃO INICIADA
Assinatura: 10/06/2014	% Execução: 0.0%
Valor: R\$ 3.830.441,27	
Empenhado: R\$ 365.799,26	

## Ferramentas disponíveis



The image shows a map of Brazil with several colored pins indicating project locations. A pop-up window is open over a pin in the state of Goiás, providing details for a project in Itumbiara. The window includes a title, a photograph of the site, and a table of contract and financial information.

**Centro de Iniciação ao Esporte**  
**CIE**

**GO - ITUMBIARA**  
Bairro: NORMA GIBALDI



**Informações sobre a Proposta:**

[Proposta 291](#)  
Habilitada e Selecionada

[Informações sobre a cidade](#)  
[Demais informações](#)

**Informações sobre o Contrato:**

<b>nº Contrato:</b> 425850-86	<b>Situação do Contrato:</b> SITUAÇÃO NORMAL
<b>Modelo II</b>	<b>Situação da Obra:</b> ATRASADA
<b>Assinatura:</b> 09/06/2014	<b>% Execução:</b> 70,27%
<b>Valor:</b> R\$ 3.128.708,02	
<b>Empenhado:</b> R\$ 3.128.708,02	

**Situação da 1ª Etapa:** Com aceite CAIXA  
**Situação da 2ª Etapa:** Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

**Dados Financeiros:**

**Valor Liberado Gestor:** R\$ 3.128.708,02  
**Valor Desbloqueado:** R\$ 2.192.371,46  
**Solicitação Financeira Pendente:** R\$ 0,00  
**Data da Última Solicitação Financeira:**

## Ferramentas disponíveis



Map showing the location of the project in Roraima, Brazil, with various colored pins indicating project locations across the region. Labels on the map include Montserrat, Dominica, Santa Lúcia, Barbados, Granada, Trindade e Tobago, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, RORAIMA, and AMAP.

Habilitada e Selecionada [Demais informações](#)

### Informações sobre o Contrato:

nº Contrato: 425977-8	Situação do Contrato: SITUAÇÃO NORMAL
<a href="#">Modelo III</a>	Situação da Obra: ATRASADA
Assinatura: 06/05/2016	% Execução: 72,13%
Valor: R\$ 3.770.801,28	
Empenhado: R\$ 3.770.801,28	

**Situação da 1ª Etapa:** Com aceite CAIXA  
**Situação da 2ª Etapa:** Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

**Dados Financeiros:**

Valor Liberado Gestor: R\$ 3.770.801,28
Valor Desbloqueado: R\$ 2.678.806,84
Solicitação Financeira Pendente: R\$ 0,00
Data da Última Solicitação Financeira:

Mais informações, acesse: [www.esporte.gov.br/cie](http://www.esporte.gov.br/cie)  
Última atualização: 28/06/2018



# Ferramentas disponíveis





Atualização  
Semanal



# Ferramentas disponíveis

h. Relatórios de evolução das obras



# Ferramentas disponíveis

## DADOS DE COMUNICAÇÃO

- ✓ Informativos e Comunicados – via mala direta para os componentes da UGL (**aproximadamente 1.100** componentes de UGL cadastrados).
- ✓ Atendimento individualizado - presencial ou por telefone.
- ✓ Esclarecimentos via e-mail – caixa postal cie@esporte.gov.br.

Ano	Quantidade de Esclarecimentos
2013	1640
2014	2350
2015	1166
2016	426
2017	931
<b>Total</b>	<b>6.513</b>

Excluídos: Informativos, Comunicados, atendimentos a outras áreas do ME, projetista, CAIXA, MPOG.

Informativos e comunicados – mais de 76 mil.

# Ferramentas disponíveis

## Promoção ou Participação em Eventos Técnicos:

- Workshop Técnico - Dez/2013;
- Encontro Regional Nordeste – Agosto/2014;
- Encontro Integração CIE – Nov/2014;
- Workshop sobre Gestão de Equipamento Esportivo – Dez/2014;
- Ativação dos CEUS (convidado palestrante) – Anápolis, Horizonte, Petrolina, Macapá – 2015.
- 1º Workshop CIE – 2017
- 1º Workshop CIE - 2018




# Ferramentas disponíveis

## Projetos disponíveis para cessão.

Providências para cessão dos projetos:

- a. Envio de ofício em meio físico e escaneado para [cie@esporte.gov.br](mailto:cie@esporte.gov.br);
- b. Informações necessárias:
  - Modelo I, II ou III;
  - Tipo de ginásio: simples ou reversível
  - Velocidade de vento: 40, 45 ou 50 m/s
- c. Providências posteriores:
  - Adequação do projeto ao terreno e à legislação local.

CIE 1 - QUADRAS REVERSIVEIS - GINÁSIO 1.796m<sup>2</sup>  
(TERRENO MEIO DE QUADRA)

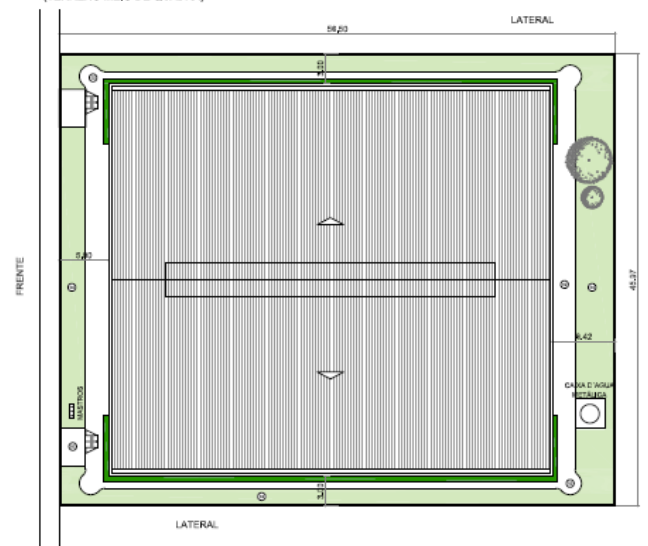

# Boas Práticas identificadas

Auditoria do TCU em 2014 – identificadas boas práticas.

Diminuir zoom (Ctrl+menos)

 **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
Relatório preliminar, sujeito a alterações pela unidade técnica

---

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**TC 004.545/2014-1**      **Fiscalização 43/2014**

**Relator:** Aroldo Cedraz

**DA FISCALIZAÇÃO**  
**Modalidade:** conformidade  
**Ato originário:** Acórdão 3.143/2013 - Plenário  
**Objeto da fiscalização:** Centros de Iniciação ao Esporte e outros  
**Período abrangido pela fiscalização:** 1/1/2012 a 27/6/2014

**DO ÓRGÃO/ENTIDADE FISCALIZADO**  
**Órgão/entidade fiscalizado:** Ministério do Esporte  
**Vinculação (ministério):** Ministério do Esporte

# Boas Práticas identificadas

Auditoria do TCU em 2014 – identificadas boas práticas.

Vale mencionar ainda que, na análise comparativa, foram identificadas boas práticas no gerenciamento da ação referente aos Centros de Iniciação ao Esporte, as quais, se estendidas às demais ações, poderiam trazer melhorias significativas ao processo de gestão. Entre tais práticas, podemos citar:

a) mapeamento prévio do macroprocesso de implantação dos CIEs e a estruturação de ferramentas de gerenciamento de projeto, o que permite visualizar com mais clareza as etapas envolvidas, responsáveis, atribuições, riscos.

b) georreferenciamento do local das obras e registro de informações gerais vinculadas à localização, o que possibilita uma melhor compreensão do contexto de implantação, seja na fase de seleção das propostas, seja na fase de acompanhamento, até mesmo depois de concluídas as obras, com a estruturação de uma base de dados da infraestrutura esportiva implantada;

c) uso de projetos padrão, o que permite melhor controle sobre a qualidade das especificações, minimiza os riscos relacionados à incapacidade de alguns entes tomadores de recursos para desenvolver projetos próprios, minimiza riscos de desvio de finalidade, possibilita o aprimoramento incremental, por meio de revisões futuras dos projetos padrão, a partir das experiências adquiridas na implantação e utilização dos centros;

# Boas Práticas identificadas

Auditoria do TCU em 2014 – identificadas boas práticas.

d) flexibilidade dos projetos, o que possibilita o ajuste a diversos contextos, minimizando o risco de incompatibilidades que poderiam restringir o atendimento do público alvo e os benefícios sociais gerados;

e) critérios objetivos e claros de seleção, promovendo maior transparência e reduzindo riscos de desvios de finalidade ou de utilização de critérios subjetivos e inadequados na escolha das propostas a serem atendidas;

f) estrutura de suporte aos tomadores de recursos, utilizando-se de diversas ferramentas e canais de interação como: a realização de workshop; a disponibilização de manuais e de exemplos de documentos preenchidos; a publicação de informativos; o acompanhamento mais direto junto aos tomadores, via telefone e e-mail; a instituição de um comitê gestor local de cada tomador, responsável pela interlocução com a Caixa e com o Ministério;

g) exigência de que os tomadores desenvolvam um plano de gestão, para garantir o adequado funcionamento e manutenção dos CIEs, após a conclusão das obras, o que minimiza os riscos de inoperância, subutilização, desvios de finalidade, deterioração precoce, entre outros;

h) integração com políticas públicas desenvolvidas por outros ministérios, com a adoção de critérios de priorização de propostas que complementem obras de urbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou do programa Minha Casa, Minha Vida já contratadas. Essa intersetorialidade mostra-se interessante quando se observa que a configuração fragmentada e desarticulada de políticas públicas pode comprometer o atendimento das necessidades da população em sua integralidade.



Centro de Iniciação ao Esporte  
Municípios Selecionados

[cie@esporte.gov.br](mailto:cie@esporte.gov.br)

**OBRIGADO**

Brasília, 05 de Julho de 2018
