

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

Retomada do planejamento no país

Marcel Olivi



PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

- Lançado em 22/01/2007 o programa é constituído por
 - Medidas de estímulo ao investimento privado
 - Ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura
 - Eixo Transportes – Rodovias, Ferrovias, Portos, Hidrovias, Aeroportos e Equipamentos para Estradas Vicinais
 - Eixo Energia – Geração e Transmissão de Energia Elétrica, Petróleo e Gás Natural, Refino e Petroquímica, Fertilizantes, Revitalização da Indústria Naval e Combustíveis Renováveis
 - Eixo Social e Urbano – Saneamento, Prevenção em Áreas de Risco, Pavimentação, Mobilidade Urbana, UBS – Unidade Básica de Saúde, UPA – Unidade de Pronto Atendimento, Creches e Pré-escolas, Quadras Esportivas nas Escolas, Praças dos Esportes e da Cultura, Cidades Históricas, Urbanização de Assentamentos Precários, Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, Água em Áreas Urbanas, Recursos Hídricos, Cidades Digitais e **Centro de Iniciação ao Esporte**

PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Objetivos

- **2007 – Acelerar o ritmo de crescimento da economia**
 - **Aumentar o emprego e a renda**
 - **Diminuir as desigualdades sociais e regionais**
 - **Superação dos gargalos na infraestrutura do País**
- **2009 – Novos projetos – Redução dos impactos da crise internacional – função anti-cíclica**
- **2011-2014 – Continuidade da 1ª fase do programa**

GESTÃO DO PAC

OBJETIVOS DO MONITORAMENTO

- **Assegurar prazos e resultados**
- **Gerenciar riscos: identificar e provocar soluções aos entraves**
- **Divulgar andamento das ações do programa para a sociedade**

MÉTODO DE MONITORAMENTO

- **Constituído por salas de situação**
 - Instância permanente e colegiada
 - Monitoramento de todo ciclo dos empreendimentos e identificar dificuldades e propor soluções para sua superação
 - Acompanhamento efetivo de metas físicas
- **Transparência – Balanços Quadrimestrais**
- **Disseminou a cultura de priorização, responsabilização e de transparência das informações**

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



Ação com cronograma em dia e com os riscos administrados



Ação com cronograma em dia e risco potencial



Ação com elevado risco, independente do cronograma ou com significativo atraso no cronograma

Porque classificar assim?

Para identificar riscos e adotar medidas necessárias à rápida solução

MELHORIA DOS PROCESSOS

- **Obras do PAC executadas por estados e municípios ganharam status de transferência obrigatória, simplificando o processo de repasse de recursos**
- **Redução do tempo de liberação de recursos para obras**
- **Licenciamento Ambiental – simplificação de procedimentos**
- **Monitoramento junto ao Tribunal de Contas da União, órgão responsável pelo controle externo dos gastos públicos federais**
- **Grupo Especial da Advocacia Geral da União, responsável por acompanhar processos judiciais**
- **Aprimoramento das modalidades de concessões e contratações**

GESTÃO DO PAC NOS MUNICÍPIOS

Monitoramento Diferenciado

- **Designação de responsável/equipe pelo acompanhamento das obras do PAC, preferencialmente ligado ao gabinete do Prefeito**
- **Reuniões com os Ministérios responsáveis ou as superintendências da Caixa para conhecer a situação das obras selecionadas e contratadas**
- **Participação nos Grupo de Gestão Integrada – GGI (Prefeitura, Caixa e SRI/SAF) por meio de representante qualificado e com capacidade de tomada de decisão**

RECOMPOSIÇÃO DA CAPACIDADE DO ESTADO

- **Nova carreira – Analista de Infraestrutura**
 - **Garantiu o corpo técnico mínimo necessário para o monitoramento e execução das obras, com uma remuneração compatível com a realidade de mercado**

RESULTADOS DO PAC 1


RESULTADOS DO PAC 1

- **Maior programa de desenvolvimento desde a década de 70**
- **Consolidou a agenda de desenvolvimento econômico e social**
- **Acelerou o crescimento da economia, estimulando o investimento público e privado, com um amplo programa de infraestrutura**
- **Gerou emprego e renda ampliando o mercado de massa**

Principais objetivos alcançados

CONCLUSÃO ORIGINAL DAS OBRAS DO PAC

Valor total do PAC 2007-2010 – R\$ 657,4 bilhões

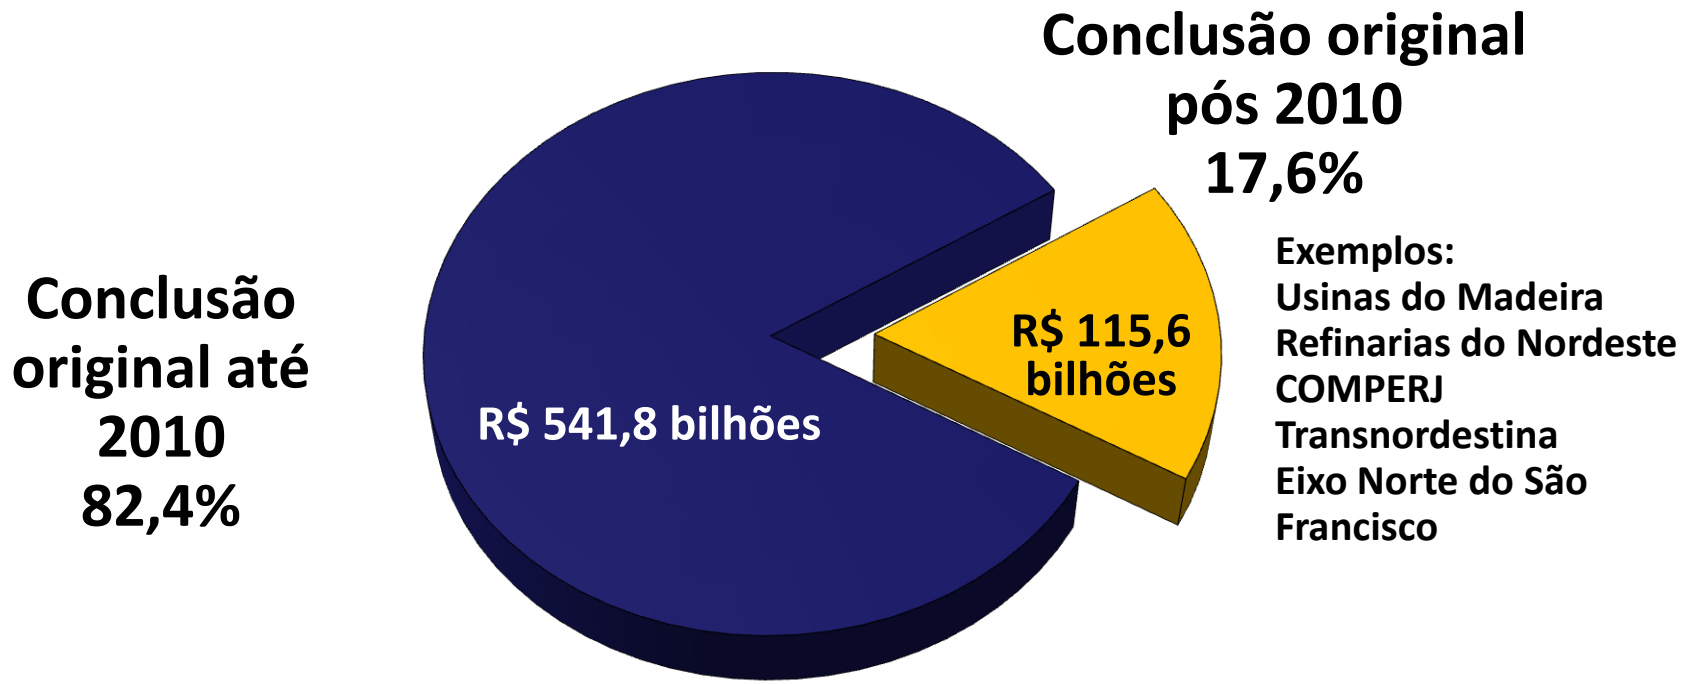

94,1% realizados até 31/12/2010 – R\$ 619 bilhões

PAC 2



COMPARATIVO DE INVESTIMENTO ENTRE PAC 1 E PAC 2

R\$ bilhões

EIXOS	PAC 1	PAC 2	Comparativo
LOGÍSTICA	104	158	↑ 52%
ENERGIA	295	466,3	↑ 58%
SOCIAL E URBANO	239	365,1	↑ 53%
TOTAL	638	989,4	↑ 55%

EXECUÇÃO DO PAC 2

PAC 2 – 2011-2014

R\$ 989,4 bilhões

67,2%
executados até Agosto/2013

DESAFIOS

Consolidação da retomada do planejamento em infraestrutura no país

- Reestruturação das áreas de formulação de projetos
- Aperfeiçoamento dos modelos de gestão setoriais
- Maior qualidade e rapidez nas obras
- Simplificação dos procedimentos de licitação, contratação e pagamento com controle e transparência
- Aprimoramento do processo de licenciamento ambiental
- Estruturação de rede de assistência técnica aos municípios, em especial os pequenos

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

Retomada do planejamento no país

Marcel Olivi

